

議案第 13 号

工事請負契約の変更について（いきいきパークみさき 5 年災第 1 号災害復旧工事）

令和 5 年 9 月 26 日議決に係るいきいきパークみさき 5 年災第 1 号災害復旧工事請負契約の変更契約を下記のとおり締結する。

令和 7 年 3 月 4 日提出

岬町長 田 代 堯

記

契 約 金 額 変更前 金 637,890,000 円
（うち消費税及び地方消費税の額 金 57,990,000 円）
変更後 金 642,929,100 円
（うち消費税及び地方消費税の額 金 58,448,100 円）

契約の相手方 大阪府摂津市東正雀 2 番 3 号
株式会社 永商興産
代表取締役 小川 晋

提 案 理 由

本工事は、現在施工中ですが、工事内容の一部変更により契約金額の変更が生じたため、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 96 条第 1 項第 5 号の規定により、議会の議決を求めるものです。

いきいきパークみさき 5年災第1号災害復旧工事

工 事 概 要

過年度に発生した地すべり災害の復旧事業

[災害復旧工事一式]


- | | |
|------------|----|
| ・ 法面工 | 一式 |
| ・ 地下水排除工 | 一式 |
| ・ 園路復旧工 | 一式 |
| ・ 亀裂開口部補修工 | 一式 |
| ・ 仮設工 | 一式 |



[主な工事内容]

- | | |
|-------------|----------------------|
| ・ グラウンドアンカー | 354本(全長 12.0m~23.0m) |
| ・ 排水横ボーリング | 62本(全長 20.0m~53.0m) |
| ・ 園路復旧 | 延長 43.0m |

[工事期間] 自 令和5年 9月26日から
 至 令和7年11月28日まで

いきいきパークみさき 5年災第1号災害復旧工事箇所図

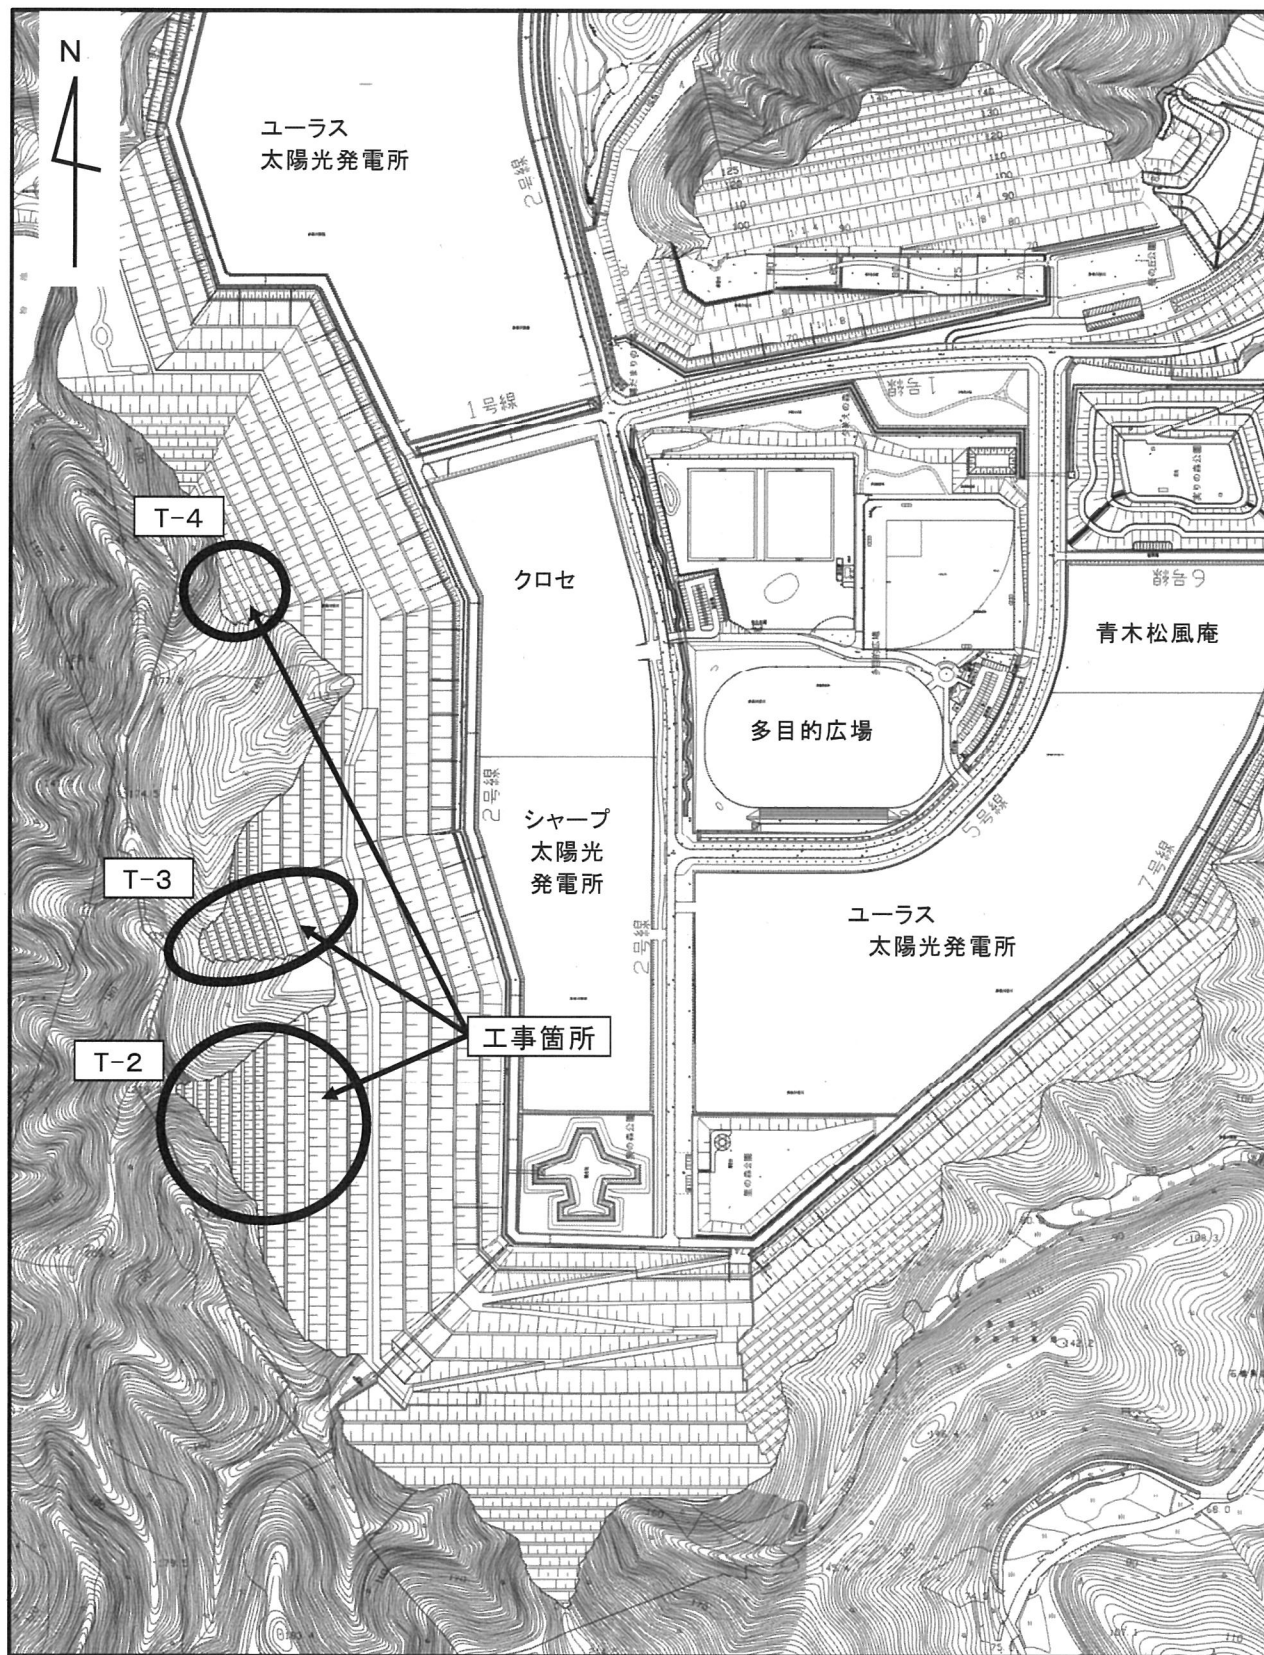

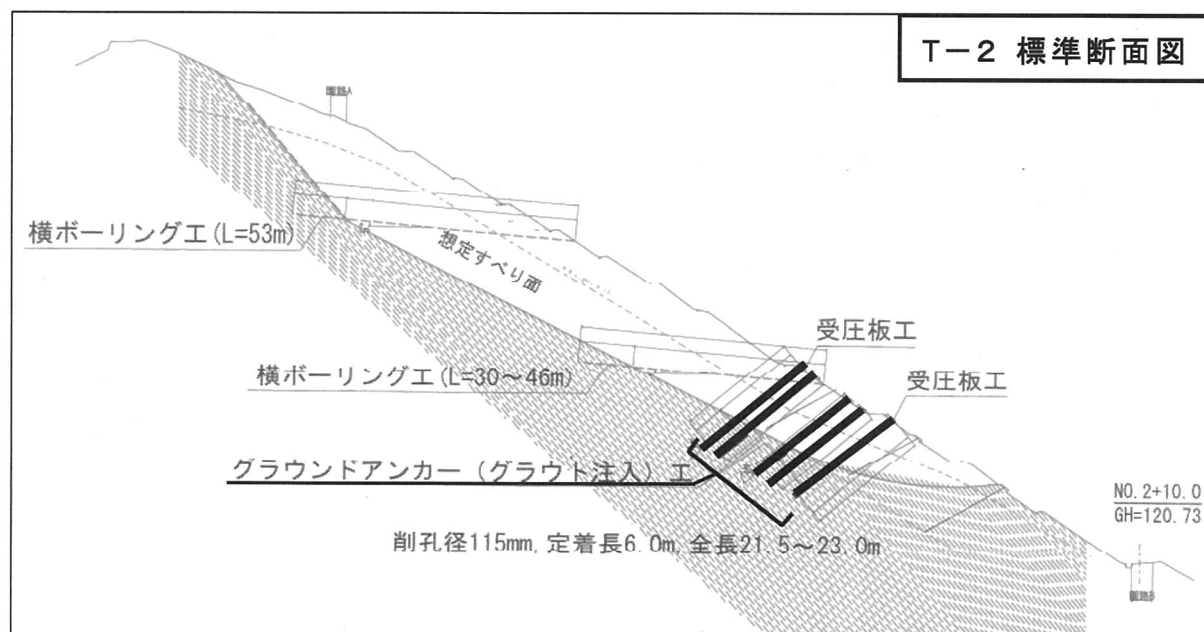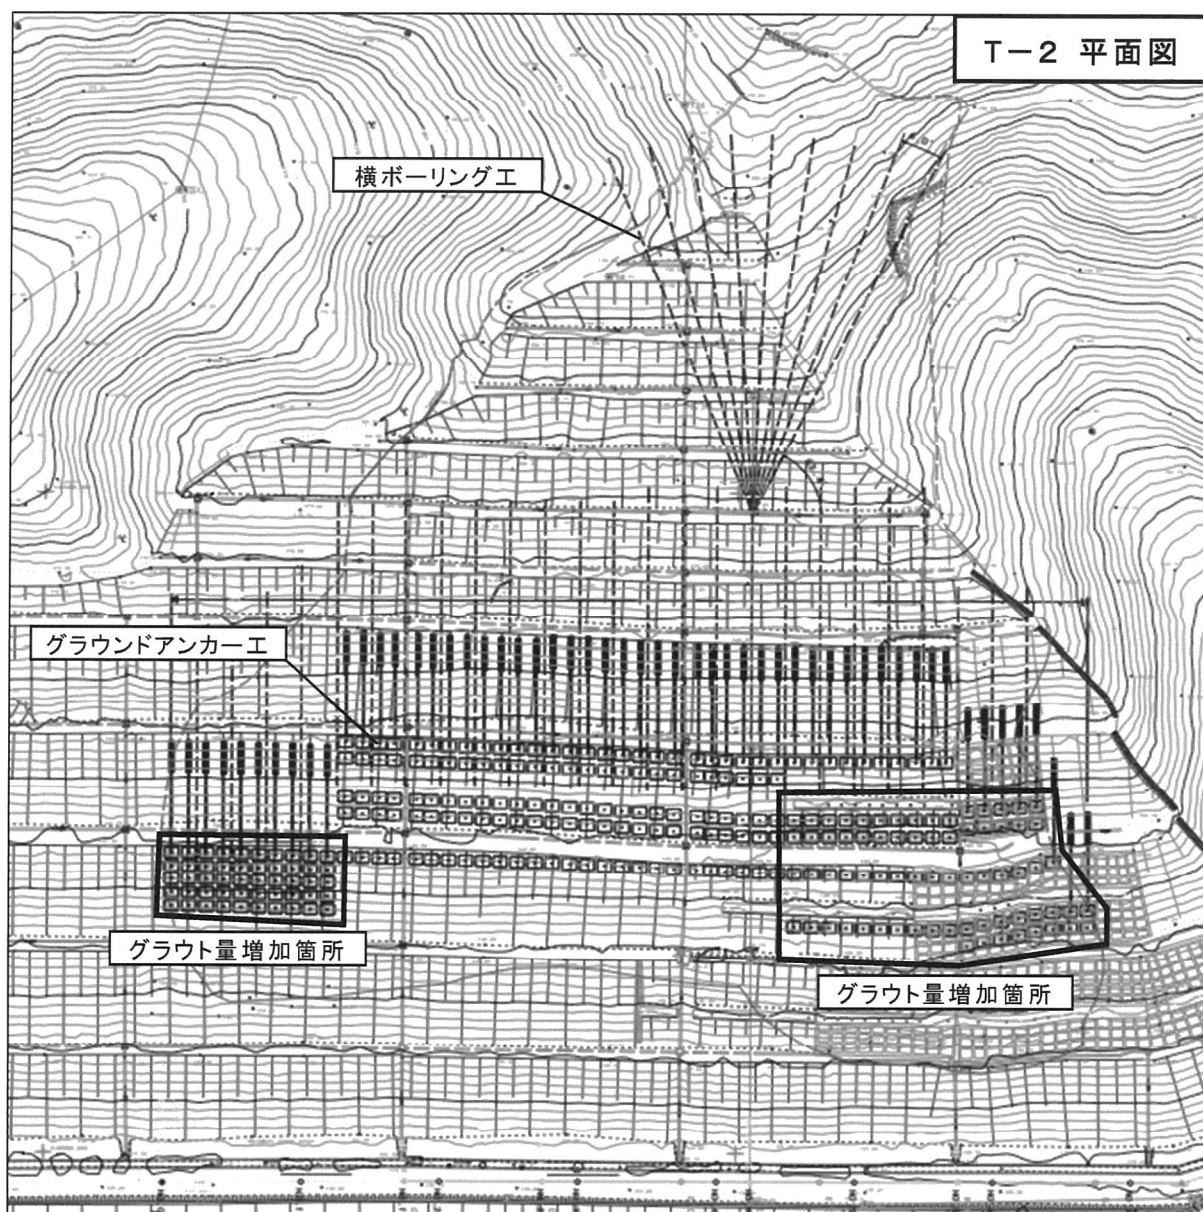

変更理由書

本工事については、令和５年９月２６日に(株)永商興産と建設工事請負契約を締結し、令和５年９月２６日から工事に着手しましたが、工事中に下記の事項が生じたことにより、請負契約の変更を行うものです。

(主な内容)

- ・グラウト注入量の増加（当初２２６ｍ^３、変更２７５ｍ^３）

グラウンドアンカーが設計時の効果を発揮するためには、深部まで存在する亀裂に対応するグラウト量を注入し、すべりやすい地層と強固な地層を一体化させる必要があります。

現地精査をしたところ、T-2ブロック既設法枠部などにおいて空洞や亀裂の存在が確認されたため想定される注入量により変更を行うものです。

５，０３９千円（増額）
